

Z m ě n o v ý l i s t č. 1

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 1 – drenáže

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 1. 6. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě kontroly souladu projektové dokumentace s položkovým rozpočtem bylo zjištěno:

- v rozpočtu je chybně menší objem obsypů drenážního potrubí
- v rozpočtu nejsou uvedeny odbočky a přesuvky drenážního potrubí
- v rozpočtu není uvedena drenážní geotextilie

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- nejsou

Vícepráce:

- větší objem obsypů
- odbočky a přesuvky
- drenážní geotextili
-

4. Finanční vyhodnocení:

Navýšení ceny o 46 468,- bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 1. 6. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 3. 6. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 5. 6. 20

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001	Kluziště Dačice
Objekt:	20	Změny
Rozpočet:	01	Drenáže - změnový rozpočet 1

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BaP holding a.s.	IČO: 27854591
	Purkyňova 35b	DIČ: CZ2784591
	612 00	Brno - Královo Pole
Vypracoval:		

Výprava:

Rozpis ceny	Celkem

HSV			59 991,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 467,70

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	46 467,70 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,30 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	46 468,00 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne 3.6.2020

Za zhotovitele

Jalla'ceh
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 072,06	4
5	Komunikace	HSV			8 048,05	1
8	Trubní vedení	HSV			7 388,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 959,19	1
Cena celkem					46 467,70	10

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	01	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	175101101RT2a	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny drenáž DN 160	m3	2,11507	1 365,60	22 072,06

sod : -5,28768

-5,28768

48,96*0,36*0,42

7,40275

2	175101101RT2b	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny drenáž DN 100	m3	14,04783	1 365,60	19 183,72
---	---------------	--	----	----------	----------	-----------

sod : -24,3

-24,30000

18,3*0,3*0,6

3,29400

18,3*0,3*0,54

2,96460

18,3*0,3*0,48

2,63520

18,3*0,3*0,42

2,30580

18,3*0,3*0,36

1,97640

16,8*0,3*0,30

1,51200

8,13*0,3*0,23

0,56097

3,79*0,3*0,12

0,13644

12,46*0,3*0,27

1,00926

15,13*0,3*0,34

1,54326

15,13*0,3*0,40

1,81560

15,13*0,3*0,46

2,08794

15,13*0,3*0,52

2,36028

15,13*0,3*0,58

2,63262

15,13*0,3*0,64

2,90496

2,87*0,3*0,64

0,55104

6,95*0,3*0,64

1,33440

6,26*0,3*0,63

1,18314

7,52*0,3*0,6

1,35360

11,61*0,3*0,61

2,12463

6,43*0,3*0,61

1,17669

5,0*0,3*0,59

0,88500

Díl: 5		Komunikace				
3	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	132,50000	30,60	8 048,05

49*0,5

24,50000

270*0,4

108,00000

4	67352024R	Geotek N 200 g/m2	m2	145,75000	27,40	3 993,55
		1,1*132,5		145,75000		

Díl: 8		Trubní vedení				
5	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plastových	kus	22,00000	64,20	7 388,40

6	28651114R	odbočka drenážní PVC 45° DN 100	kus	7,00000	114,00	798,00
---	-----------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------

7	28651116R	odbočka drenážní PVC 45° DN 160	kus	15,00000	200,00	3 000,00
---	-----------	---------------------------------	-----	----------	--------	----------

8	28651100R	přesuvka drenážní PVC DN 110	kus	7,00000	54,00	378,00
---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------	--------

9	28651106R	přesuvka drenážní PVC DN 160	kus	15,00000	120,00	1 800,00
---	-----------	------------------------------	-----	----------	--------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	27,53625	325,36	8 959,19

Změnový list č. 2

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 2 – změna skladby podkladních násypů pod hřiště

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 14. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě připomínek TDI a dodavatele stavby k navržené skladbě podkladních násypů pod hřiště zpracoval projektant stavby změnu PD – řez B, číslo výkresu D.1.1.2.9, ze dne 11.6.2020

Přílohy:

- změnový výkres č. D.1.1.2.9
- změnový rozpočet

Méněpráce:

- vrstvy násypů dle původního návrhu

Vícepráce:

- vrstva násypů dle změnového výkresu

4. Finanční vyhodnocení:

Nedochází ke změně ceny. Jednotkové ceny jsou použity v souladu se zněním SOD, u dvou horních vrstev je, stejně jako v nabídkovém rozpočtu, kalkulováno se zvýšenými náklady na provedení rovinnosti dle požadavku technologie povrchu hřiště nad požadavky normy pro zemní práce a podkladní násypy.

5. Stanovisko zhotovitele:


Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.
Radomír Šteco, v Brně, dne: 14. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 15. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 15. 7. 20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001 Kluziště Dačice

Objekt: 20 Změny

Rozpočet: 2 Násypy

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: BaP holding, a.s.

IČO: 27854591

Purkyňova 35b

DIČ: CZ27854591

612 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,16 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

dne

15. 4. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-20 772,12	####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 772,28	####
Cena celkem					0,16	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	2	Násypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	564762114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm	m2	-1 090,40000	286,00	0,00
		sod : -1090,4		-1 090,40000		-311 854,40
2	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	-1 090,40000	120,00	-130 848,00
		sod : -1090,4		-1 090,40000		
3	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-1 090,40000	71,00	-77 418,40
		sod : -1090,4		-1 090,40000		
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 16-32	m2	0,00000	148,00	0,00
		sod : -1090,4		-1 090,40000		
		dle změny PD 1090,4		1 090,40000		
5	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 090,40000	194,00	211 537,60
		dle změny PD 1090,4		1 090,40000		
6	564851112RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm 16-32	m2	1 090,40000	163,00	177 735,20
		dle změny PD 1090,4		1 090,40000		
7	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	1 090,40000	120,00	130 848,00
		dle změny PD 1090,4		1 090,40000		

ŘEZ B - detail u mantinelu

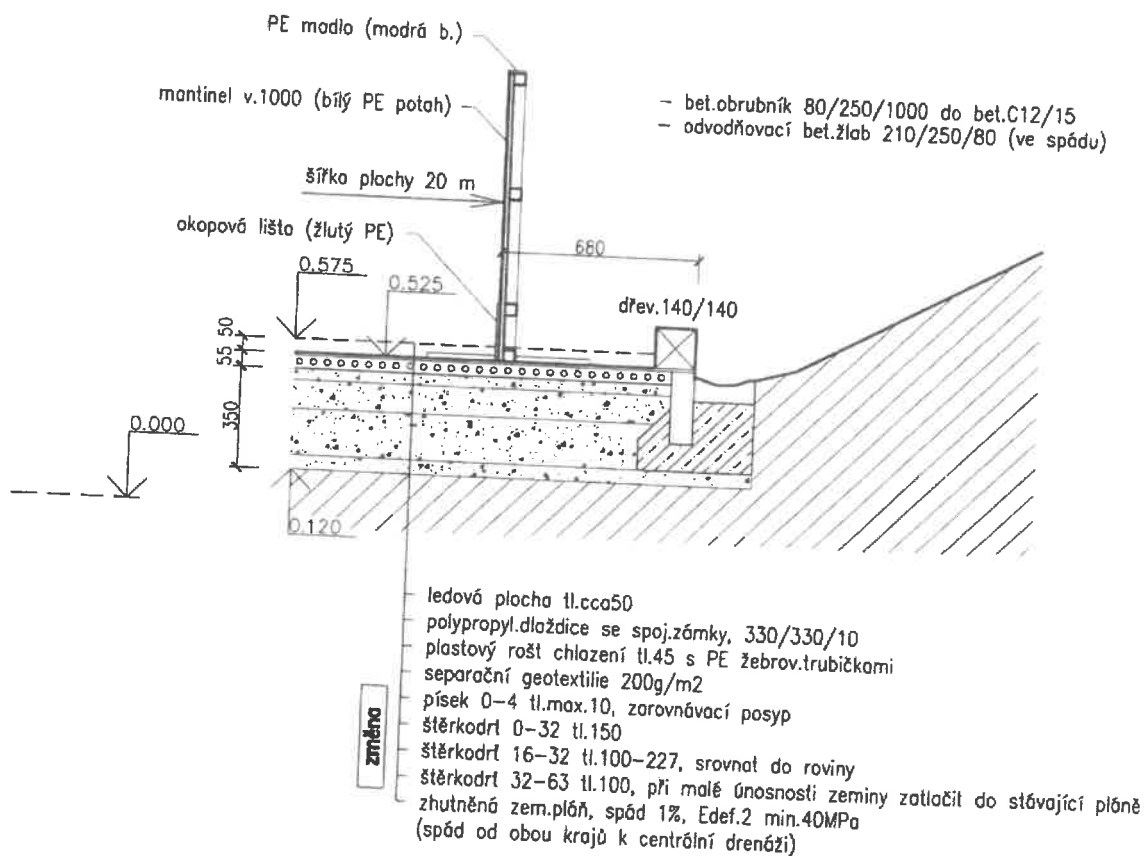

POZN.

- je třeba dodržet celkovou tloušťku násypu šterků 35 cm od výš. kóty 0,120.

$$0,000 = 478,850$$

ZMĚNA 11.6.2020

zodp. projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONINSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajčírova 27, 38013 Dačice I	měřítko	1:25
stavba	Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích	účel	DPS
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	zak. č.	30219
obsah	ŘEZ B	datum	6/2020
		č. výkr.	D.1.1.2.9

Z m ě n o v ý l i s t č. 3

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 3 – opěrná stěna

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 21. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Dle projektové dokumentace navržená úprava stávajícího svahu v zadním rohu areálu by nezajistila dostatečnou stabilitu svahu, a proto bylo dohodnuto provedení opěrné stěny včetně zkrácení odvodňovacího žlabu a prodloužení kanalizace.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- část příkopového žlabu

Vícepráce:

- opěrná stěna ze šalovacích tvárnic včetně základového pasu a stříšky
- svodné KG potrubí

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 37 238,- bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 21. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 23. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 23. 7. 20

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	001	Kluziště Dačice
---------	-----	-----------------

Objekt:	20	Změny
---------	----	-------

Rozpočet:	3.1	Opěrná stěna
-----------	-----	--------------

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BaP holding, a.s.	IČO: 27854591
	Purkyňova 35b	DIČ: CZ27854591
	612 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			31 722,18
-----	--	--	-----------

PSV			5 516,00
-----	--	--	----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			37 238,18
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	37 238,18 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	7 820,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	-0,18 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	45 058,00 CZK
--------------------------	----------------------

v Jašič dne 23.9.2020


Za zhotoviteľa


Za objednávateľa


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 311,22	12
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 401,00	23
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 967,48	40
5	Komunikace	HSV			218,94	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			489,00	1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			-846,00	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 180,54	11
721	Zdravotní instalace ,kanalizace	PSV			5 516,00	15
Cena celkem					37 238,18	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	3.1	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 311,22
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,10000	763,20	2 365,92
		základový pás : 6,2*0,5*1,0		3,10000		
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,90000	397,00	1 945,30
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				8 401,00
3	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,10000	2 710,00	8 401,00
		6,2*0,5*1,0		3,10000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 967,48
4	311112130RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	6,00000	1 380,00	8 280,00
5	311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)	t	0,07624	40 270,00	3 070,18
		1,08*0,888/1000*(6,0*2*4+21*1,5)		0,07624		
6	345232122R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	6,10000	593,00	3 617,30
Díl: 5		Komunikace				218,94
7	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,50000	115,50	57,75
8	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	0,27000	597,00	161,19
		3*0,3*0,3		0,27000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				489,00
9	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	1,50000	326,00	489,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				-846,00
10	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	-4,00000	211,50	-846,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 180,54
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	12,84897	325,36	4 180,54
Díl: 721		Zdravotní instalace ,kanalizace				5 516,00
12	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	279,00	1 116,00
13	8mat020	Zemní práce pro venkovní rozvody kanalizace výkopy , obsyp a zahmuti (potrubí)	m	4,00000	1 100,00	4 400,00

Změnový list č.4

Název akce:

„Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 4 - podkladový plastový rošt pod povrch Stilmat kolem vlastní ledové plochy

2. Zpracovatel změněnového listu:

BaP holding a.s.

ing. Čeněk Vrbka, v Brně, dne: 18.9.2020

3. Popis změny a zdůvodnění:

Dle projektové dokumentace se nepředpokládalo, že univerzální plastový sportovní povrch Stilmat, je vhodnější i mimo vlastní chlazenou plochu, také položit na plastový rošt Icegrid, ale bez hadic. Jiné řešení by nezaručilo volnou dilataci chladicí plochy a současně rovný přechod mezi oběma podkladovými plochami.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Vícepráce:

Byl dodán a kolem chladicí plochy položen další plastový rošt ICEGRID bez hadic o celkové ploše 233 m².

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 37 238,- bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Ing. Zdeněk Mokroš, v Brně dne: 18.9.2020

6. Stanovisko objednatele:

Změnový list byl schválen na kontrolním dni v Dačicích dne: 22.9.2020.

8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby. Dačicích dne: 22.2.2020

Položkový rozpočet změna č 4

S:	Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v Dačicích				
O:	Technologie chlazení				
č. položky	Technologie chlazení	měrná jednotka	Množství	cena	cena celkem
3	Systém chlazení plochy,plastový rošt a žebrované potrubí vč ventilů	m²	849,00	2 810,00	2 385 690,00
Změna	Systém chlazení plochy,plastový rošt a žebrované potrubí vč ventilů	m²	233,00	1 500,00	349 500,00
15	Montáž technologie	kpl	1,00	356 500,00	356 500,00
Změna	Montáž technologie	kpl	1,00	56 000,00	56 000,00
Cena za objekt celkem bez DPH:					405 500,00

Z m ě n o v ý l i s t č. 5

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 5 – snížení terénu podél hřiště

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 27. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Z důvodu zajištění odvodu povrchové vody z nového hřiště bylo objednatelem požadováno provedení snížení terénu podél hřiště na straně k fotbalovému hřišti. S touto úpravou nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- nejsou

Vícepráce:

- odkopávky a zhutnění

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 37 261,- Kč bez DPH.

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 27. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínky a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 30. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 30. 7. 20

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	001	Kluziště Dačice
Objekt:	20	Změny
Rozpočet:	5.1	snížení terénu podél hřiště

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BaP holding, a.s.	IČO: 27854591
	Purkyňova 35b	DIČ: CZ27854591
	612 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			37 260,54
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			37 260,54
---------------	--	--	------------------

[illegible]

Rekapitulace daní	
-------------------	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	37 260,54 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	7 825,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,46 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	45 086,00 CZK
--------------------------	----------------------

Taciturn

23.9.2020


Za zhotovitele

Jelenc
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 188,06	43
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			21 072,48	57
Cena celkem					37 260,54	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	5.1	snížení terénu podél hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 188,06
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 <i>52*4,4*0,12</i>	m3	27,45600 <i>27,45600</i>	477,60	13 112,99
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	27,45600	112,00	3 075,07
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				21 072,48
3	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>52*4,4</i>	m2	228,80000 <i>228,80000</i>	92,10	21 072,48

Z m ě n o v ý l i s t č. 6

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 6 – úprava plochy za trubním kanálem

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 27. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Zadávací dokumentace neřešila úpravu plochy za trubním kanálem a proto bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto provedení úpravy odkopáním původní zeminy, srovnáním a provedení násypu ze štěrkodrti.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- nejsou

Vícepráce:

- odkopávky zeminy
- provedení zpevněné plochy ze štěrkodrti

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 55 245,- Kč bez DPH:

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 30. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 30. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 30. 7. 20

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001	Kluziště Dačice
Objekt:	20	Změny
Rozpočet:	6.1	úprava plochy za trubním kanálem
Objednatel:		IČO:
		DIČ:
Zhotovitel:	BaP holding, a.s.	
	Purkyňova 35b	
	612 00	Brno
IČO: 27854591		
DIČ: CZ27854591		
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		55 245,13
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		55 245,13
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 245,13 CZK
Základní DPH	21 %	11 601,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK
Cena celkem s DPH		66 846,00 CZK
v <u>Dačice</u> dne <u>23.9.2020</u>  Za zhotovitele  Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 499,71	14
5	Komunikace	HSV			29 169,60	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 575,82	34
Cena celkem					55 245,13	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	6.1	úprava plochy za trubním kanálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 499,71
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 0,3*2*21,2	m3	12,72000 12,72000	477,60	6 075,07
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	12,72000	112,00	1 424,64
Díl: 5		Komunikace				29 169,60
3	181201111R00	Úprava pláňe na násypech se zhutněním - ručně (2,2+21,2+1,8)*12-4*4,8	m2	283,20000 283,20000	21,50	6 088,80
4	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	283,20000	81,50	23 080,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 575,82
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	57,09312	325,36	18 575,82

Z m ě n o v ý l i s t č. 7

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 7 – odvoz a uložení zeminy

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 27. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele byla horní šterková část odkopku ponechána na deponii na staveništi. Odvoz pro další využití zajistil objednatel.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- nakládání výkopku
- odvoz a uložení části odkopku na skládku

Vícepráce:

- nejsou

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází ke snížení ceny o 115 639,- Kč bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 27. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 30. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 30. 7. 20

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		001	Kluziště Dačice
Objekt:		20	Změny
Rozpočet:		7.1	odvoz a uložení zeminy
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 27854591 DIČ: CZ27854591	
		BaP holding, a.s. Purkyňova 35b 612 00 Brno	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-115 639,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-115 639,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-115 639,00 CZK
Základní DPH	21 %		-24 284,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-139 923,00 CZK
v <u>Dačicích</u> dne <u>23.9.2020</u>			
<u>[Signature]</u> Za zhotovitele		<u>[Signature]</u> Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-115 639,00	100
Cena celkem					-115 639,00	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	7.1	odvoz a uložení zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-115 639,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m hřiště : 0,15*23,5*46,4 vsakovací objekt : 0,15*7,2*7,8	m3	171,98400	56,90	9 785,89
					163,56000	
					8,42400	
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	-171,98400	112,00	-19 262,21
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	-1 140,90800	47,67	-54 387,08
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (520+974,6)/1,7-1141	m3	-261,82353	197,75	-51 775,60
					-261,82353	

Z m ě n o v ý l i s t č. 8

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 8 – úprava svahu

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 21. 7. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě připomínek TDI a dodavatele stavby bylo dohodnuto z důvodu zajištění stability svahu provedení úpravy svahu podél hřiště. S touto úpravou nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- nejsou

Vícepráce:

- odkopávka zeminy
- svahování

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 16 412,- bez DPH.

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.

Radomír Šteco, V Brně, dne: 21. 7. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínky a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 21. 7. 20



8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 15. 7. 20

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		001	Kluziště Dačice
Objekt:		20	Změny
Rozpočet:		4.1	Úprava svahu
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		BaP holding, a.s.	IČO: 27854591
		Purkyňova 35b	DIČ: CZ27854591
		612 00	Brno
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 412,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 412,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 412,14 CZK
Základní DPH	21 %		3 447,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,14 CZK
Cena celkem s DPH			19 859,00 CZK
v <u>Dačicích</u> dne <u>23.9.2020</u>			
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 412,14	100
Cena celkem					16 412,14	100

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	4.1	Úprava svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 412,14
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 128,28*0,15	m3	19,24200 19,24200	477,60	9 189,98
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	19,24200	112,00	2 155,10
3	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 3*42,76	m2	128,28000 128,28000	39,50	5 067,06

